



1、利用井筒与防冲冒可靠焊接，不须另加设专用小直径柱，又间距1.0m，柱间距用螺栓连接，顶部用钢板焊接成圈。

2、利用主井内一对角主筋自下而上逐层焊接成暗装引下线，利用建筑物混凝土内构造柱内两根φ16以上主筋延长焊接作防雷引下线，其下端与接地体焊接，上端伸出屋面经避雷带避雷带焊接，要求各引下线在经过每层横梁及楼板时，与梁或板内主筋焊接作接地。





竣工测量图




北面



西面



屋面层

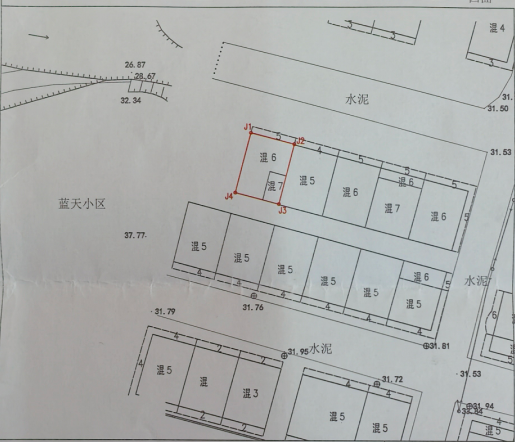

界址点坐标表(CGCS2000)

点号	X	Y	边长
J1	2444993.856	36565121.426	7.80
J2	2444991.867	36565128.968	10.80
J3	2444981.424	36565126.214	7.80
J4	2444983.413	36565118.672	10.80
J1	2444993.856	36565121.426	

S=84.24 平方米 含0.1264亩

建筑面积分层核实景图

规划	一层	二至六层	屋面层
	规划审批 建筑面积(㎡):84.24	规划审批 建筑面积(㎡):93.60/每层	规划审批 /
核	一层	二至六层	屋面层
	核实结果 建筑面积(㎡):84.24	核实结果 建筑面积(㎡):93.60/每层	核实结果 层高不足2.20米,不计算建筑面积。

阳台进深表		建筑标高表	
东面		名称	边长
西面		室内地坪高度(米)	
南面		室内外高度差(米)	
北面			
建筑物高度(米)		建筑面积表	
名称	高度(米)	名称	建筑面积(㎡)
一层	3.69	一层	84.24
二层	3.10	二层	93.60
三层	3.13	三层	93.60
四层	3.17	四层	93.60
五层	3.18	五层	93.60
六层	3.15	六层	93.60
总建筑高度	19.42	总建筑面积	552.24

广西北港测绘有限公司		项目	罗康德 罗昆德房屋竣工规划核实
审核	王清浩	图纸	罗康德 罗昆德
校对	刘青超	名称	住宅房屋竣工测量图
绘图	黄承荣	图例	罗康德 罗昆德
签字	黄承荣	比例	1:500
签字	黄承荣	图纸编号	北港测(2025第253)号
签字	黄承荣	日期	2025.12.25
